

ROADMAP ESTRATÉGICO

Nova geração MAX


Aqui organizamos as datas da campanha de lançamento da **nova geração Penalty MAX** e o papel de cada canal em cada fase, da construção dos assets à sustentação da linha.

A jornada tem quatro fases: **Construção** (novembro), **Aquecimento** (novembro e dezembro), **Lançamento** (dezembro) e **Sustentação** (janeiro a março de 2027).

Marco central: MUNDO FUTSAL PENALTY EXPERIENCE
Foz do Iguaçu · 14 a 19/12 · cerca de 3 mil pessoas por dia.

Prazos de produção são estimativas a validar com fornecedores. As medidas do estande e o detalhamento dos modelos por território dependem de materiais do cliente [a definir].

Calendário da campanha

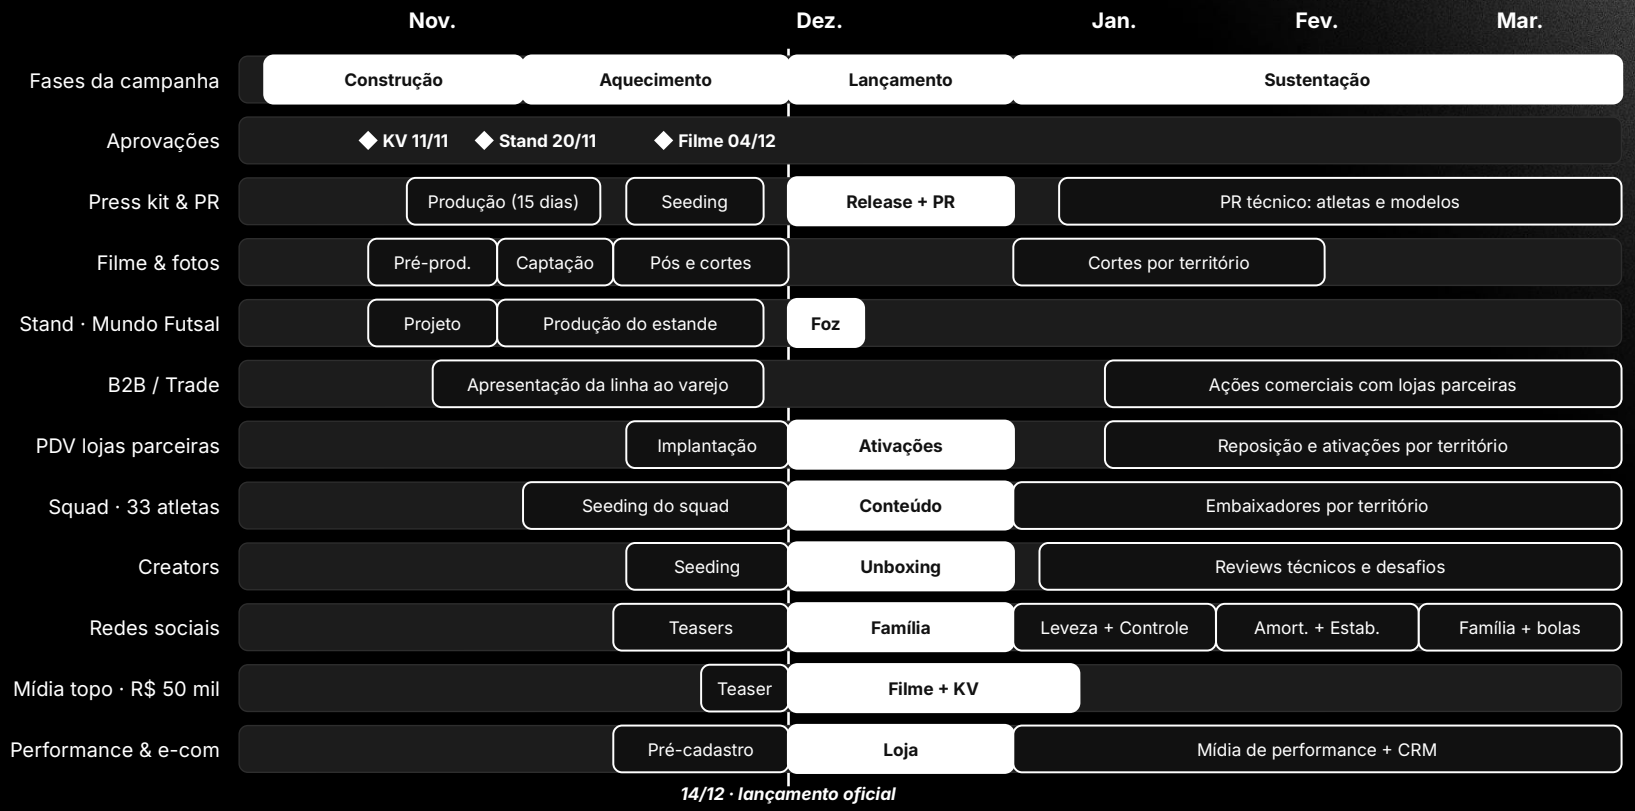

14/12 · lançamento oficial



Atenção:
se o KV atrasar, o press kit e o estande atrasam juntos. Cada dia de atraso no press kit encurta a janela de seeding antes do evento.

O calendário do lançamento é definido de trás para frente: o evento em Foz do Iguaçu (14/12) determina quando o press kit precisa estar pronto, e o press kit determina quando o KV precisa ser aprovado.

Caminho crítico

- **11/11** · Aprovação do KV (peça padrão + adaptação para o estande) e do conceito do press kit
- **13/11** · Arte final do press kit, incluindo itens complementares (adesivos, papel de seda)
- **14 a 28/11** · Produção do press kit (prazo estimado de 15 dias)
- **20/11** · Projeto do estande aprovado [depende das medidas enviadas pelo cliente]
- **21 a 29/11** · Captação de filme e fotos dos 5 modelos e da linha de bolas
- **01 a 11/12** · Seeding do press kit: squad, creators, formadores de opinião e imprensa
- **12 e 13/12** · Montagem do estande
- **14/12** · Lançamento oficial no Mundo Futsal Penalty Experience

O planejamento financeiro acompanha esse cronograma: cada aprovação libera o pagamento da produção correspondente.

Canais por fase

	Construção · Nov.	Aquecimento · Nov./Dez.	Lançamento · Dez.	Sustentação · Jan. a Mar.
Redes sociais	Plataforma e linha editorial	Teasers de detalhe de produto	**Família + um post por território**	**Série técnica: um território por mês**
Squad · 33 atletas	Mapeamento por estado	Seeding com embargo	**Conteúdo de estreia + evento**	**Embaixadores por território**
Creators	Lista e briefing	Press kit + teaser	**Unboxing e desafios**	**Reviews e comparativos**
Press kit & PR	Conceito e produção	**Envio para imprensa**	**Release + cobertura**	Pautas técnicas
Evento Mundo Futsal	Projeto do estande	Produção e montagem	**Estreia ao vivo · Foz**	Conteúdo de arquivo
Mídia topo de funil		Teaser (07 a 13/12)	**Filme + KV (até 10/01)**	
Performance & CRM		Pré-cadastro	E-mail de lançamento	**Remarketing por modelo**
E-commerce	Página da família	Avise-me	**Loja + comparador**	**Ofertas por território**
B2B · PDV	Argumentário de venda	**Sell-in + implantação**	**Vitrine e ativações**	Reposição e ações comerciais

Foco da fase Canal ativo

NOVEMBRO 2026
Construção · 03/11 a 22/11



CONSTRUÇÃO
Montar o time

A fase em que a plataforma criativa da família MAX é definida e tudo o que tem prazo longo de produção é destravado. A prioridade é aprovar o KV até 11/11 e o press kit logo em seguida: os 15 dias de produção definem a data do seeding e da presença no evento.

AÇÕES-CHAVE

- 1ª apresentação: estratégia, KV (peça padrão + adaptação para o estande), press kit e direcional do stand.
- **11/11:** aprovação do KV e do conceito do press kit.
- **13/11:** arte final do press kit, com adesivos e papel de seda; produção a partir de 14/11.
- **20/11:** projeto do estande aprovado, após o envio das medidas pelo cliente.
- Pré-produção de filme e fotos dos 5 modelos e das bolas, organizada pelos 4 territórios.

Tudo o que tem prazo industrial é aprovado primeiro; o restante da campanha se desdobra a partir do KV.

consumidor

Ainda sem comunicação aberta. Definição das mensagens de cada território: Controle, Amortecimento, Estabilidade e Leveza.

varejo

Argumentário de venda da família e guia comparativo dos modelos para o sell-in.

squad & creators

Mapeamento do squad (33 atletas, 8 estados) e da lista de seeding.

*

ESTRATÉGIA POR CANAIS

→ PRODUÇÃO

Objetivo: Garantir os assets a tempo do evento.

Filme e fotos em uma única captação, com produto em detalhe e em jogo, para abastecer lançamento e sustentação.

→ B2B / TRADE

Objetivo: Preparar o sell-in.

Apresentação da linha e materiais de PDV desenvolvidos junto com os assets da campanha.

→ INFLUÊNCIA E PR

Objetivo: Fechar a lista de seeding.

Atletas do squad, creators de futsal, formadores de opinião e imprensa especializada, distribuídos por região.

→ E-COMMERCE

Objetivo: Estruturar a página da família.

Organização dos modelos por território para facilitar a escolha do jogador.

NOVEMBRO / DEZEMBRO
Aquecimento · 23/11 a 13/12



AQUECIMENTO
Esquentar a quadra

Antes de mostrar os produtos, a campanha mostra que algo está vindo. Teasers com detalhes de cabedal, solado e bola, o press kit nas mãos de quem forma opinião no futsal e o varejo conhecendo a família antes do consumidor.

AÇÕES-CHAVE

- **01 a 11/12:** seeding do press kit para squad, creators, formadores de opinião e imprensa, com embargo até 14/12.
- **A partir de 30/11:** teasers nas redes, com close de produto e sem revelar os modelos.
- **16/11 a 11/12:** apresentação da linha ao varejo, com argumentário por território.
- Implantação do PDV nas lojas parceiras na semana anterior ao lançamento.
- Pré-cadastro no e-commerce para aviso de lançamento.

O aquecimento cria expectativa no consumidor e garante produto e PDV prontos no varejo.

consumidor

Curiosidade: contagem regressiva e pistas da nova geração MAX. Convite para o evento em Foz do Iguaçu.

varejo

Sell-in com comparativo dos modelos e calendário de chegada do produto.

squad & creators

Unboxing gravado com embargo, pronto para ir ao ar em 14/12.

*

ESTRATÉGIA POR CANAIS

→ REDES SOCIAIS

Objetivo: Gerar expectativa.

Teasers em Reels e TikTok com detalhes de produto; perfis do squad repostam a contagem regressiva.

→ MÍDIA TOPO DE FUNIL

Objetivo: Ampliar o alcance do teaser.

Primeira parte da verba de R$ 50 mil na última semana (07 a 13/12), segmentada por interesse em futsal e pelas regiões do squad.

→ E-COMMERCE / CRM

Objetivo: Captar demanda.

Página de pré-cadastro "avise-me" e e-mail para a base Penalty.

→ B2B

Objetivo: Garantir produto e PDV no lançamento.

Visitas e apresentação às lojas parceiras, com entrega do kit de PDV.

DEZEMBRO 2026
Lançamento · 14/12 a 31/12



LANÇAMENTO
Apito inicial

A nova geração MAX é apresentada oficialmente no Mundo Futsal Penalty Experience, em Foz do Iguaçu. O evento é a estreia da campanha: o que acontece no estande alimenta o digital, e todos os canais abrem ao mesmo tempo.

AÇÕES-CHAVE

- **14/12:** fim do embargo. Filme, KV e produtos no ar em todos os canais.
- **14 a 19/12:** estande no evento, com cerca de 3 mil pessoas por dia testando os modelos por território.
- Squad e creators publicam o unboxing e os conteúdos gravados.
- Release para a imprensa especializada e cobertura do evento.
- Produto disponível no e-commerce e ativações nas lojas parceiras.

Concentração de esforço: mídia, conteúdo, influência, PR, e-commerce e PDV abrem juntos.

consumidor

Conhecer a família e descobrir qual MAX combina com o seu jeito de jogar.

varejo

PDV implantado, vendedores treinados e argumentos por território.

squad & creators

Presença no evento, conteúdo de quadra e desafios com os modelos.

*

ESTRATÉGIA POR CANAIS

→ MÍDIA TOPO DE FUNIL

Objetivo: Alcance e lembrança.

Maior parte da verba de R$ 50 mil entre 14/12 e 10/01, com filme e KV em vídeo curto.

→ REDES SOCIAIS

Objetivo: Apresentar a família.

Carrossel da família, um post por território e cobertura ao vivo do evento.

→ E-COMMERCE

Objetivo: Converter.

Página da família com comparador de modelos; e-mail para a lista do pré-cadastro.

→ PDV

Objetivo: Visibilidade e argumentação.

Vitrine da família, expositor por território e ativações nas lojas parceiras.

→ PR

Objetivo: Reforçar a autoridade da Penalty no futsal.

Release, cobertura do evento e entrevistas com atletas do squad.



Seis dias e cerca de 3 mil pessoas por dia: o maior público de futsal reunido durante a campanha. O estande é o primeiro lugar onde o jogador vê, toca e testa a nova geração MAX.

Cronograma do estande

- **Até 20/11:** projeto aprovado [medidas a receber do cliente]
- **21/11 a 11/12:** produção
- **12 e 13/12:** montagem · 14 a 19/12: evento · 20/12: desmontagem

Ativação no estande

- Parede da família MAX com os 4 territórios: Controle, Amortecimento, Estabilidade e Leveza
- Prova dos calçados e teste da linha de bolas
- Encontros com atletas do squad e distribuição de itens do press kit (adesivos)

Digital

- Conteúdo gravado no estande vira posts, stories e material para a sustentação


Público

Cerca de 3 mil pessoas por dia, até 18 mil visitas em 6 dias. Cadastro no estande para o CRM do lançamento.

Varejo

Convite a lojistas e parceiros para conhecer a linha no estande.

SUSTENTAÇÃO
Cada jeito de jogar



Com a família apresentada, a campanha aprofunda cada modelo. Cada mês destaca territórios, com atletas do squad e creators mostrando em quadra o benefício de cada tecnologia, aproveitando a volta aos treinos e o início da temporada.

AÇÕES-CHAVE

Um território por vez

- **Janeiro:** Leveza e Controle
- **Fevereiro:** Amortecimento e Estabilidade
- **Março:** família completa + linha de bolas

Frentes

- Conteúdo técnico: tecnologias, construção e "qual MAX é a sua".
- Ações comerciais com lojas parceiras e e-commerce.

A família continua sendo a assinatura: cada território aparece como parte da mesma linha.

consumidor

Benefício claro por modelo: qual calçado responde ao seu jeito de jogar.

varejo

Ações comerciais e reposição de PDV por território.

squad & creators

Atletas embaixadores por território e reviews técnicos de creators.

*

ESTRATÉGIA POR CANAIS

→ MÍDIA DE PERFORMANCE

Objetivo: Transformar interesse em venda.

Remarketing de quem viu o lançamento e campanhas por modelo para o e-commerce e as lojas parceiras.

→ REDES SOCIAIS

Objetivo: Aprofundar os diferenciais.

Série técnica com um território por mês, com atletas e creators.

→ CRM

Objetivo: Recompra e indicação.

E-mails segmentados por território e para os cadastros feitos no evento.

→ PDV

Objetivo: Manter a família visível.

Reposição de materiais e ações comerciais com lojas parceiras.
